

2-4-1


남청라IC~서인천IC~신월IC 경인고속도로 지하화 추진 및 녹지대 조성

주관부서	과장	도로팀장	담당자
도 로 과	☎4030	☎4521	☎4522

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○	○			2,004,100	834,200			1,169,900	
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										55%

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인고속도로 및 청라진입도로 상습정체 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 인천 서부지역 대규모 개발사업(제3연륙교, 인천공항 확장)에 따른 교통량 증가 대비 - 도로 지하화를 통하여 남북으로 단절되었던 인천을 하나로 연결 - 원도심 재생을 촉진하여 주거환경 개선 										
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 남청라IC~신월IC ○ 사업규모: L=19.3km(4~6차로, 전 차종 통행) ○ 사업기간: 2022.~2032. ○ 총사업비: 20,041억원(국비 8,342, 도로공사 11,699) ○ 사업내용: 남청라IC~신월IC 지하도로 건설, 상부도로 일반화 										
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.05.: 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부) ○ 2022.06.: 예비타당성조사 시행 * B/C값 낮아 남청라IC~신월IC(19.3km) → 봉수지하차도~신월IC(15.3km) 변경 ○ 2025.01.: 예비타당성조사 통과 ○ 2025.12.: 타당성조사 용역 착수(국토부) 										
주민참여실적	(단위: 횟수)										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">설명회· 공청회 등</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">만족도 조사</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">민간 전문가 자문</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">언론· 방송 보도</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타					
설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타							
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2027.~: 타당성조사 이행 후 기본 및 실시설계 추진 ○ 2028.: 공사 착공 ○ 2033.: 공사 준공 										

위치도

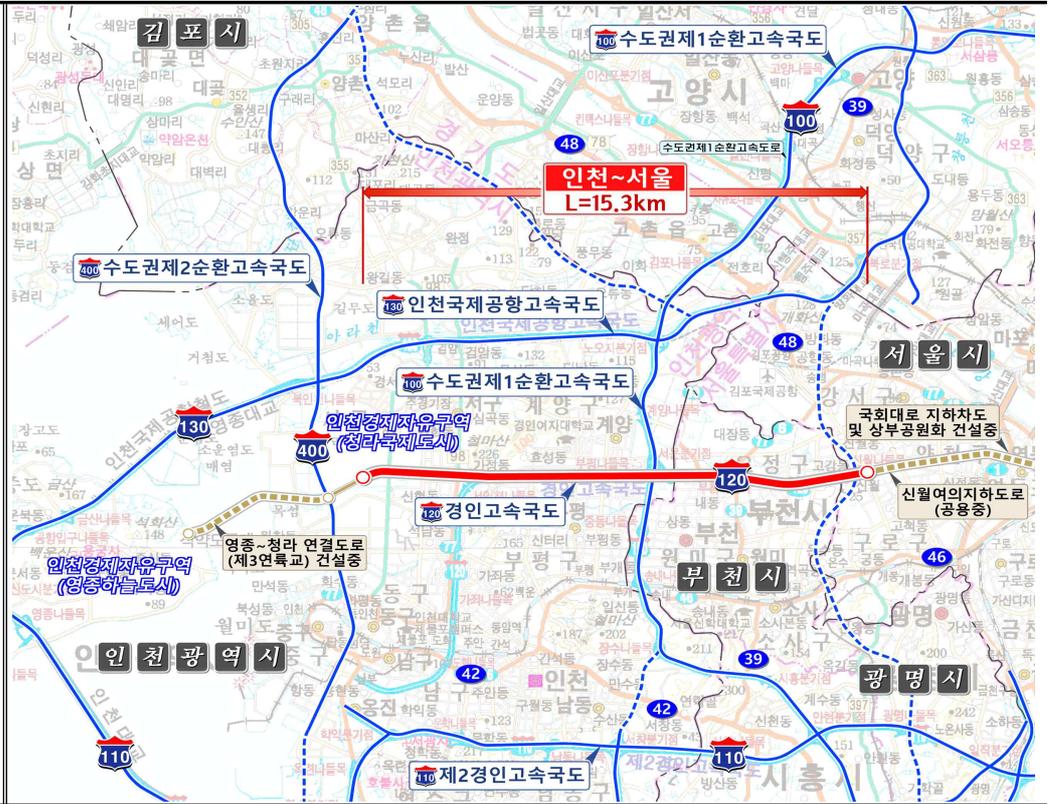

□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2022년	○ 예비타당성조사 시행	○ 예비타당성조사 시행	10%
2023년	○ 예비타당성조사 완료 ○ 타당성평가 시행	○ 예비타당성조사	30%
2024년	○ 타당성평가 완료 및 행정절차	○ 예비타당성조사	40%
2025년	○ 타당성평가 완료 ○ 기본 및 실시설계	○ 예비타당성조사 완료 ○ 타당성조사 용역 착수	70%
2028년	○ 공사 착공		100%

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	2,004,100								
국비	834,200								
시비									
구비									
도로공사	1,169,900								

※ 사업시행자 미정
